جَافِعِ بَهُ الْحُالِبُ الْمُعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ

مُجِيِّعُ النَّيْخُ الْجُبِيْنِ لَهُ الْمُؤْمِ

إدارة المشاريع

المهندس محمد فادي مجاهد المهندس المحاضرة الثالثة عشر


2020-1-12

ۼۼٵڸۺٙۼٚٳڿٷؚؽ؆ٙڲؾٲۯڡ ۼٵؽڿۣؠڔؙڵڸڰٵڸۺۼٳؽ


مسألة

المهام السابقة	المدة	المهمة
-	4	А
А	3	В
A, B	4	С
А	5	D
B, D	6	Е
С	3	F
E, F	4	G
G	2	Н

- 1. ما هو طول المسار الحرج؟
- 2. ما هو المسار الحرج؟
- 3. ما هو الوقت الحر للمهمة C؟
- . تبين لاحقا أن مدة C ستكون 6 ، ما هو طول المسار الحرج الجديد؟
- 5. تبين لاحقا أنه يمكن تقصير مدة D إلى 2 ، ما هو المسار الحرج الجديد؟ (يتم التطبيق على المسألة الأصلية دون النظر إلى الطلب السابق)

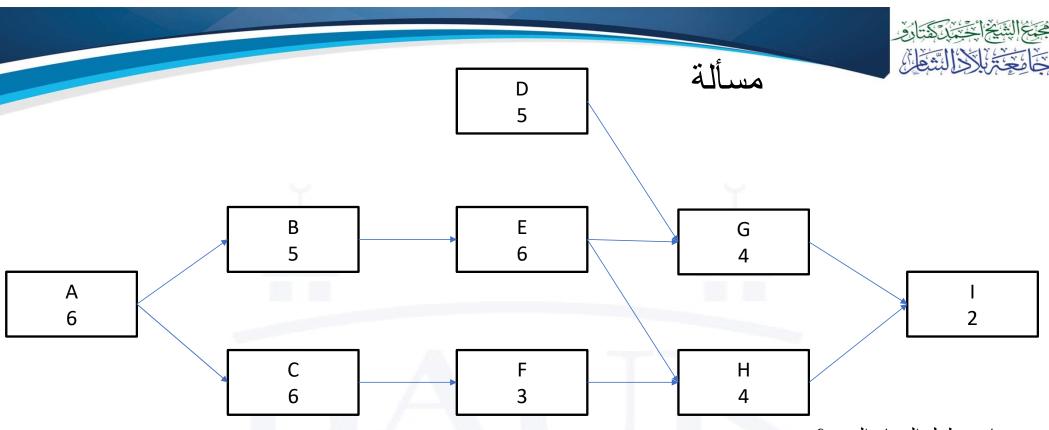

- 1. ما هو طول المسار الحرج؟
 - 2. ما هو المسار الحرج؟
- 3. ما هو الوقت الحر للمهمة F?
- . تبين لاحقا أن مدة C ستكون 7 ، ما هو طول المسار الحرج الجديد؟
- 5. تبين لاحقا أنه يمكن تقصير مدة E إلى 3 ، ما هو المسار الدرج الجديد؟ (يتم التطبيق على المسألة الأصلية دون النظر إلى الطلب السابق)

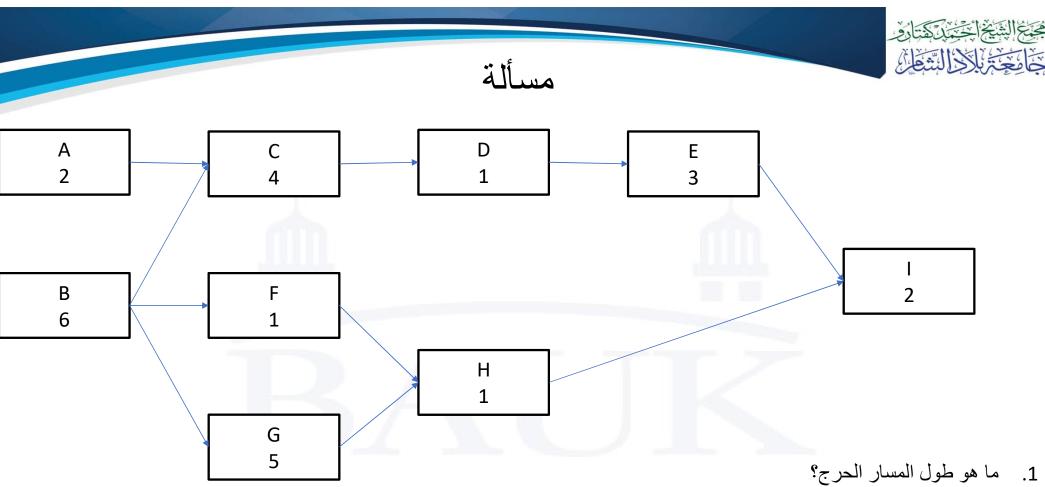

- 2. ما هو الوقت الحر للمهمة G?
- 3. تم اصدار قرار بأن آخر مدة لإنهاء المشروع هي 14. كيف يتغير الوقت الحر للمهمة E؟
- 4. تم إصدار قرار بأن نهاية المشروع يمكن تأخير ها إلى 18 و تم تغيير مدة المهمة H إلى 3. ماهي النهاية المتأخرة للمهمة G؟

